

Sitzung Innkommission

Sitzung der Innkommission

- Bericht über den Stand des Projektes
- Allfälliges
- Termin und Ort der nächsten Tagung


Konstituierende Sitzung der Gemeinsamen Aufsichtskommission

- Diskussion und Beschlussfassung über das Reglement der gemeinsamen Aufsichtskommission
- Bericht aus der Begleitkommission
- Information der Schweizer Behörden
Umsetzung der Ersatzmaßnahmen

Protokollerstellung

TOP 1: Organisation GKI

Beteiligungsverhältnisse der GKI GmbH



Geschäftsführung der GKI GmbH



DI Johann Herdina
(TIWAG)



DI Peter Loidl
(VERBUND)



DI Michael Roth
(EKW)

Projektleitung



DI Franz Gappmaier
(VERBUND)



Ing. Klaus Schretter
(TIWAG)

Stand Uferbefestigung Stauraum:

- Der Baubeginn erfolgte am 2.11.2015 mit der Errichtung der Baupisten
- Die Arbeiten sind im Plan. Einbau Sohlgrund rd. 1.200m von 1.800m , Ufersicherung bis Baupiste 1 rd. 1000m von 1.800m, Blocksatz Baupiste bis Kantonstraße rd. 300m von 1.800m
- Die Arbeiten zur Verbreiterung der Kantonstraße wurden begonnen.



Herstellung Blocksatz

Schuttkegelabtrag

- Der Schuttkegelabtrag ist abgeschlossen.

Innumleitung

- Die Sohlgrundsicherung für die Innumleitung wurde eingebaut
- Im März wurde der Inn umgeleitet.

Aktueller Stand Gründung Wehranlage Ovella

- Mit der Herstellung der Bohrpfähle wurde Mitte Februar begonnen, es sind 61 von insgesamt 155 Stück hergestellt.

Wehr Ovella




Gemeinschaft
schafft Kraft

Übersicht Baustelle mit Inn Umleitung

WO – Innumleitung/Fischbestandsbergung

– 19.3.2016 bei Sunkabfluss

- geringer Fang (3 Fische: 2 x Bachforelle und 1 x Elritze)

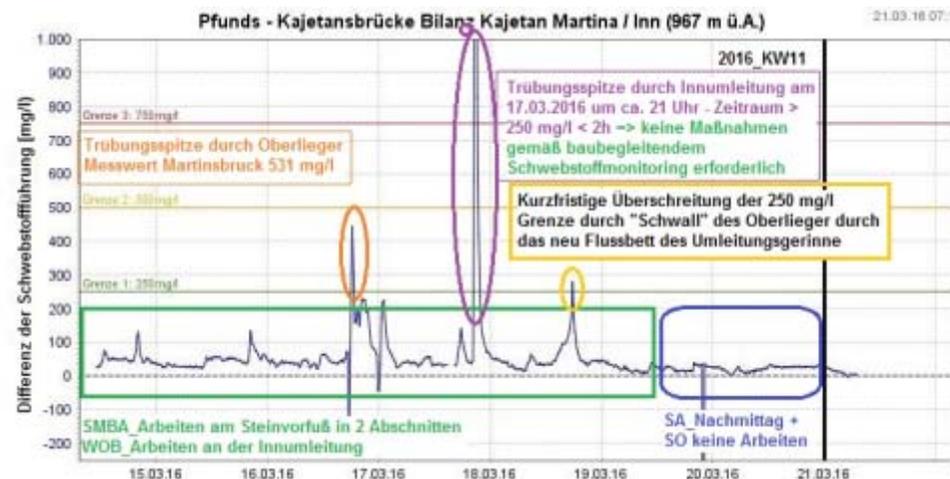

Stand Bauarbeiten – Wehrbereich Ovella




Übersicht Baustelle mit Inn Umleitung

Stand Bauarbeiten – Wehrbereich Ovella



Stand Bauarbeiten – Maria Stein

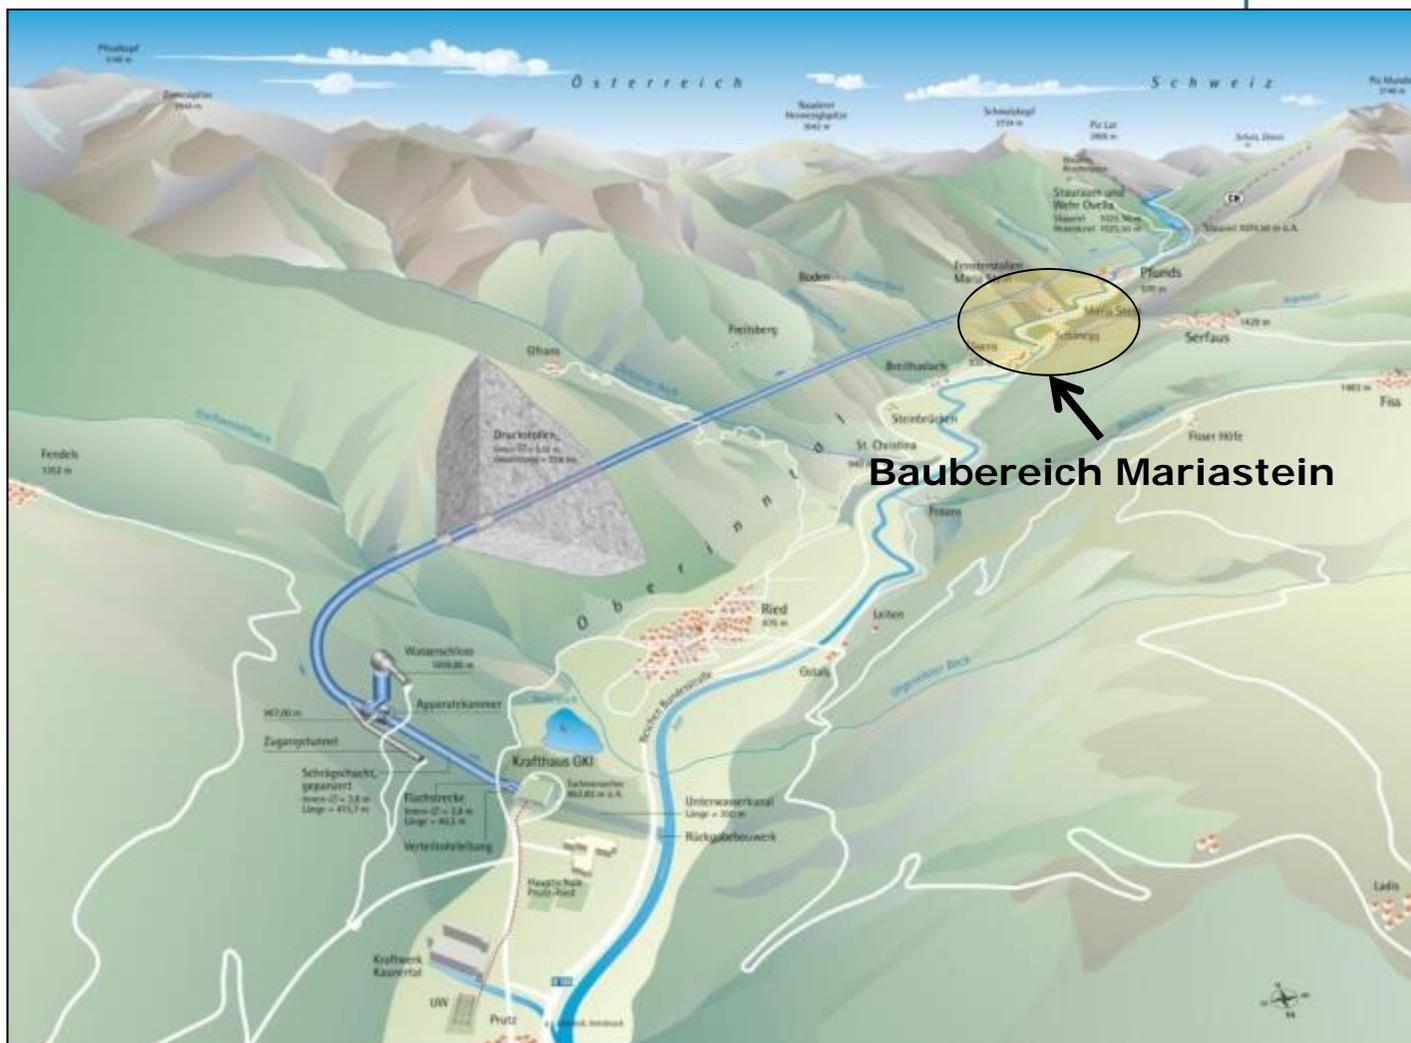


Stand Bauarbeiten - Baubereich Mariastein

Zyklischer Vortrieb abgeschlossen am 14.06.2015

TVM Süd: Vortriebsstand per 07.06.2016 - TM 1.310 von 12.075

TVM Nord: Vortriebsstand per 07.06.2016 - TM 605 von 9.407

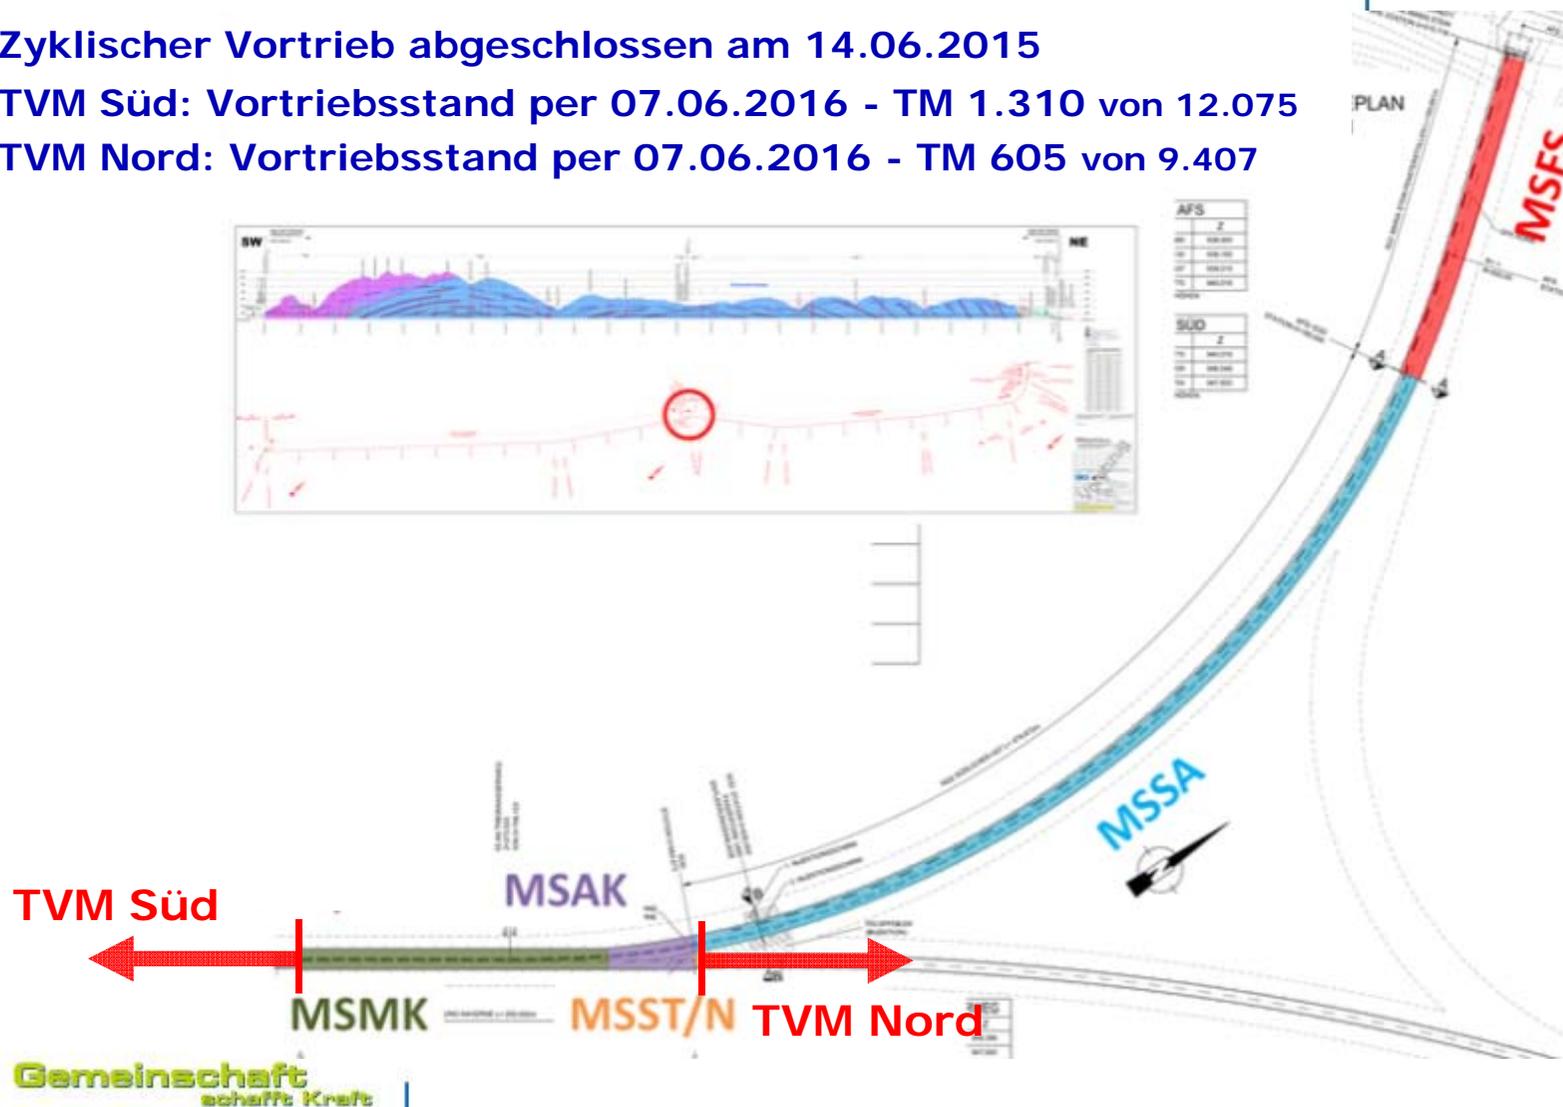

Lagerfläche Mariastein




Baustelleneinrichtungsfläche Maria Stein



Aktueller Stand – Triebwasserweg




Stand Bauarbeiten – Prutz

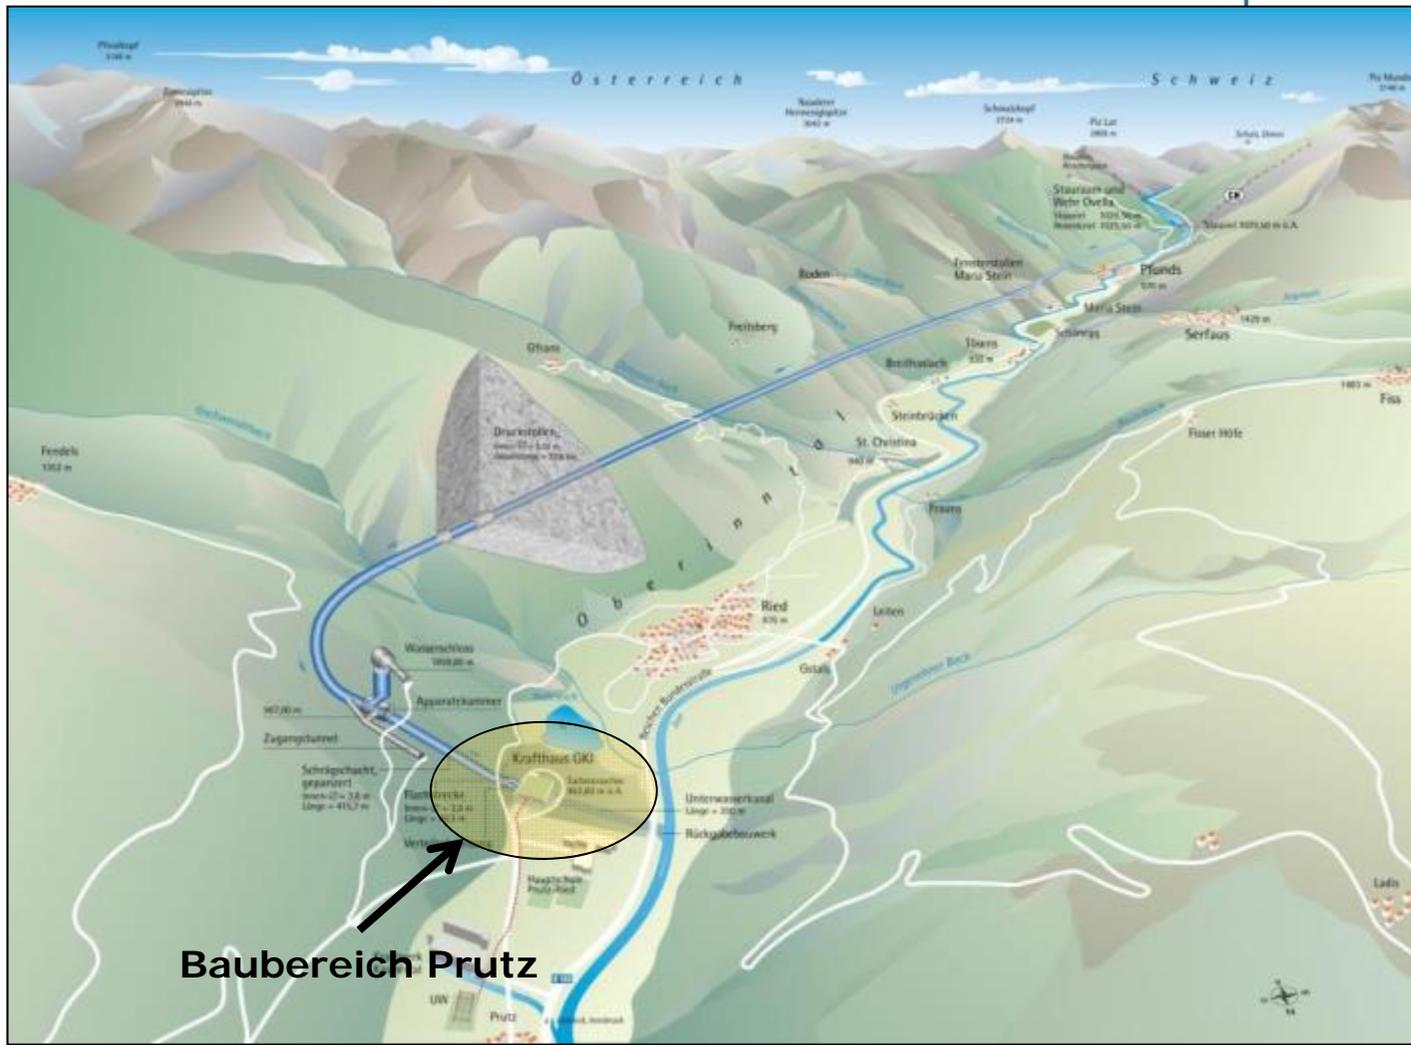

Baubereich Prutz

Übersicht Vortriebe

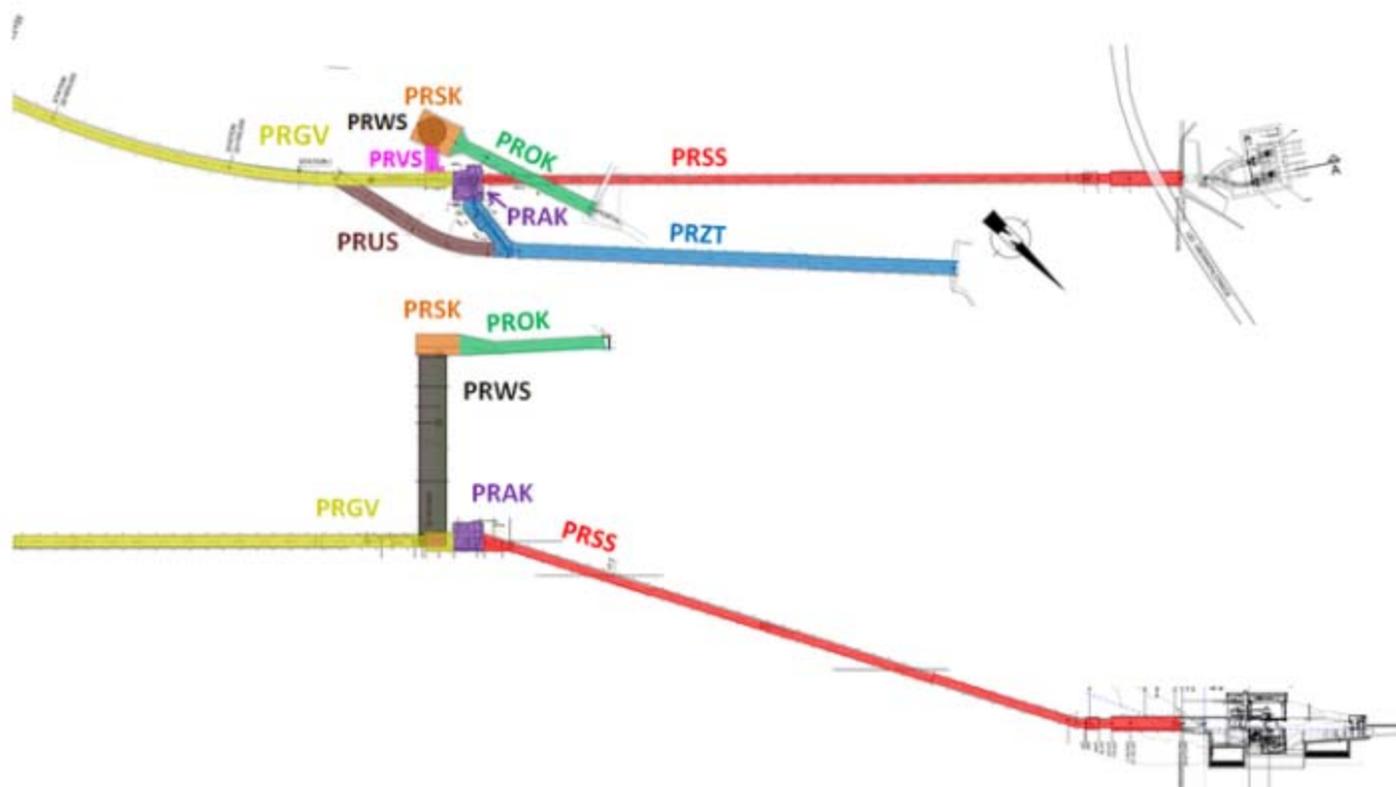

SÄMTLICHE VORTRIEBE WURDEN AM 02.04.2016 ABGESCHLOSSEN

Stand Bauarbeiten - Krafthaus Prutz/Ried



Abteufen des Wasserschlossschachtes

Stand Bauarbeiten - Krafthaus Prutz/Ried



Stand Bauarbeiten - Krafthaus Prutz/Ried

Krafthausbereich



Krafthaus



Blockbetonierung

Krafthaus



Blockbetonierung

Baugrube Krafthaus



Antransport Saugrohr




Einbau Saugrohr am 7.3.2016

TOP 8: Bericht der Geschäftsführung

Stand Bauarbeiten – Zeitplan (schematisch)



Stand 25. GV – 11.12.2015

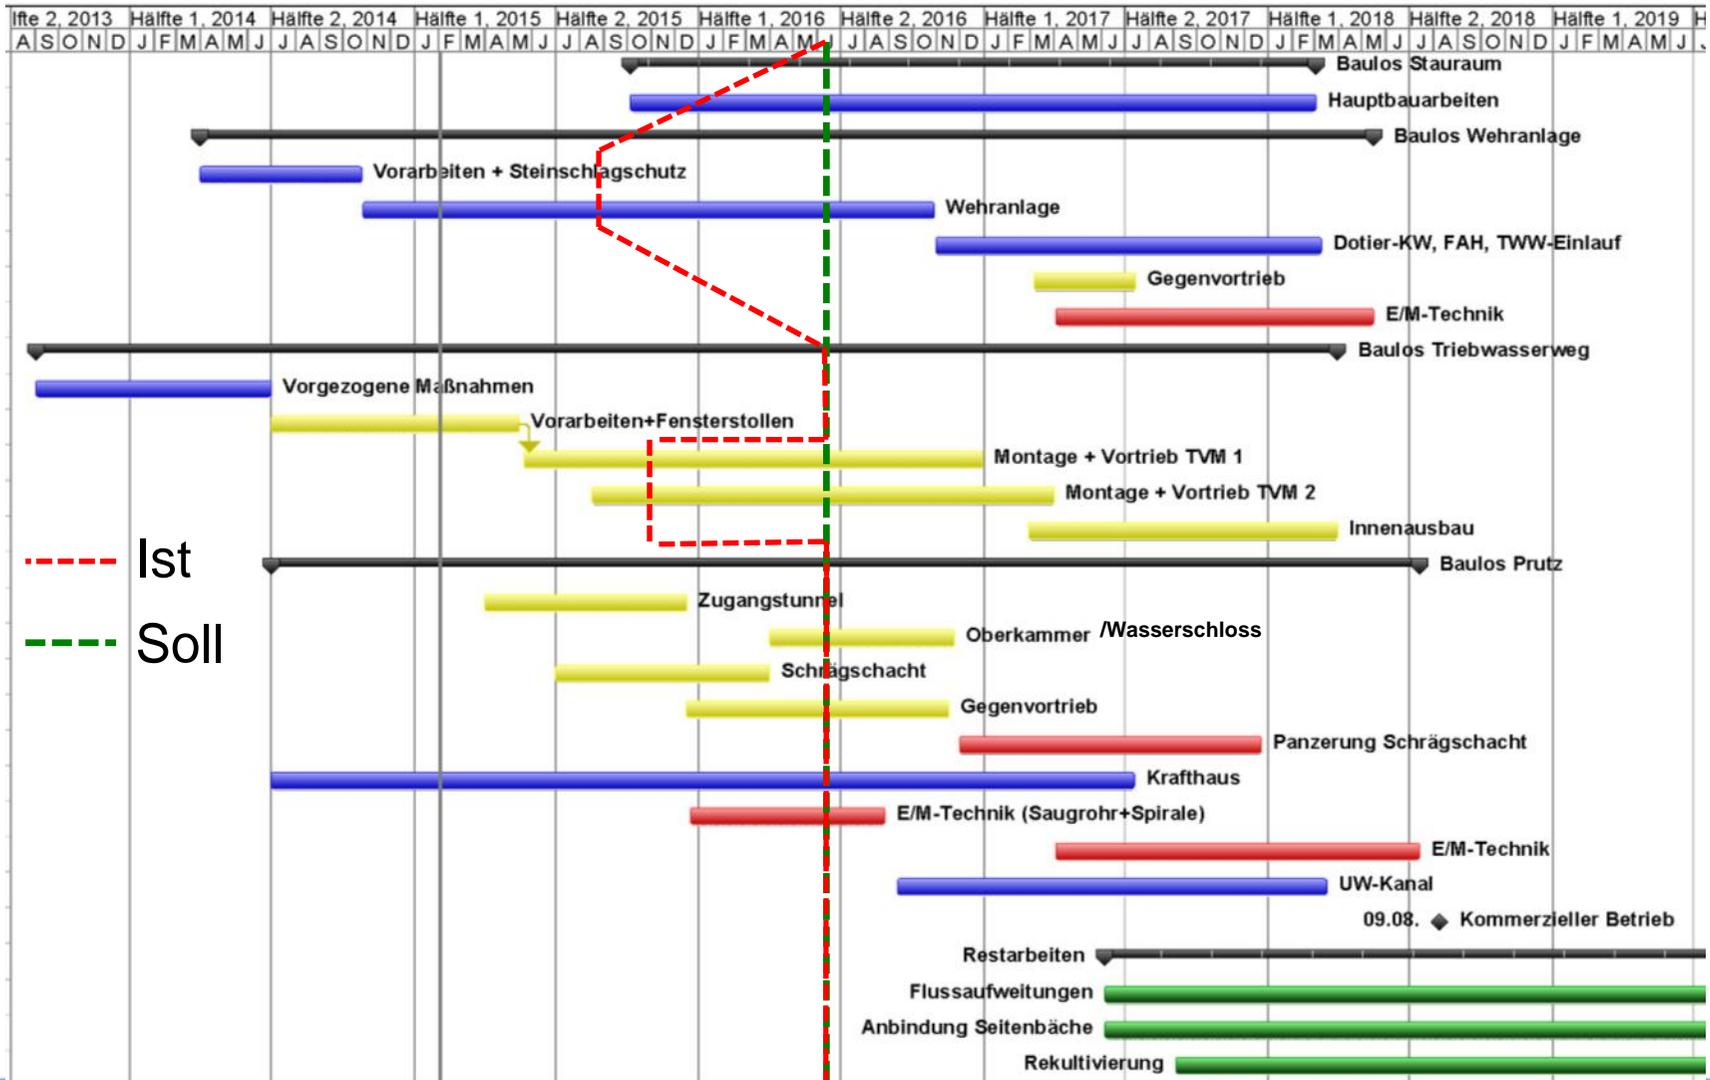

Stauraum

- Weiterführung der laufenden Arbeiten

Wehranlage Ovella

- Herstellung der Bohrpfähle
- Aushub Baugrube Wehranlage
- Start Betonbauarbeiten Wehranlage

Mariastein Stollenvortrieb

- Vortrieb der beiden TVM
- Tübbingproduktion

Maria Stein Lagerfläche

- Schutterung und Einbau Fräsmaterial auf Deponie
- Fortsetzung Nassbaggerung

Prutz/Ried, Untertage

- Injektionen Wasserschloss und Gegenvortrieb
- Innenausbau Hohlraumbauten
- Einbau Stahlpanzerung Schrägschacht

Prutz/Ried, Krafthausbereich

- Betonarbeiten Krafthaus
- Diverse Montagearbeiten, Einbau Spirale

Prutz/Ried, Unterwasserkanal

- Baugrubenumschließung UW-Kanal
- Betonbauarbeiten

- **Besprechungen UTBA:**
 - Monatliche Jour fixes UTBA – UBB – UBA – bBA
 - zweistaatliche Koordinationsbesprechungen lt. GF.16
 - laufende Abstimmungen mit PG und bBA
 - Halbjahres - Informationsveranstaltung

■ NHG-Ersatzmaßnahmen:

- Projekt definiert: Revitalisierung Aue Panas-ch
- Vorprojekt entworfen und den Behörden präsentiert
- Aktuell: Festlegung Verantwortlichkeiten, Sicherstellung Finanzierung
- Auflageprojekt bis ca. Ende 2016

